

**Feei**

Fondo para la Excelencia de  
la Educación y la Investigación

**INFORME DE MONITOREO**

**Proyecto "Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa  
del Paraguay 2030 (PNTE 2030)"**

## **INFORME SEMESTRAL**

**PERIODO INFORMADO: JULIO a DICIEMBRE 2020**

*Proyecto conjunto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Secretaría Técnica de Planificación del  
Desarrollo Económico y Social (STP) y el Ministerio de Hacienda (MH)*

**Fecha de presentación : 27 de enero de 2021**



*[Signature]*  
Dra. Giancarlo Cerna  
Coordinador General  
Proyecto PNTE 2030

## PARTE 1 - ANTECEDENTES

La calidad educativa, orientada en las exigencias del mundo actual, que enfatiza la formación de ciudadanos críticos, creativos, innovadores, con las competencias necesarias para resolver los problemas globales, es un proceso de construcción social que requiere el compromiso de toda la sociedad. Paraguay, en la mayoría de los casos, ha desarrollado programas educativos que apuntan a la universalización de la educación formal pero aún requiere de una mejora sustancial en la equidad del servicio educativo. Tomando como base de apoyo las experiencias exitosas en las últimas reformas nacionales, regionales e internacionales, se espera construir el PNTE 2030, con una nueva visión integradora, basada en acciones concretas que lleven a una transformación educativa integral con énfasis en la calidad. La preparación de un PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030 legitimados por la ciudadanía requerirán el diseño y la implementación de un proceso de consulta nacional amplio para alcanzar consensos sobre las prioridades educativas y desarrollar posibles estrategias para abordar las distintas problemáticas del sistema.

El documento original del proyecto fue aprobado por Resolución CAFEEI N° 61 del 23 de noviembre de 2017, "Por la cual se aprueba el proyecto Diseño de la estrategia de transformación educativa del Paraguay 2030".

Posteriormente, se realizaron las siguientes modificaciones aprobadas por el CAFEEI:

- Resolución N° 85 del 26 de diciembre de 2018, "Por la cual se aprueban las modificaciones realizadas y se autoriza la ampliación del plazo del proyecto "Diseño de la estrategia de transformación educativa del Paraguay 2030", al 31 de diciembre de 2019.
- Resolución N° 11 del 13 de septiembre de 2019, "Por la cual se autoriza la extensión de plazo del proyecto "Diseño de la estrategia de transformación educativa del Paraguay 2030", al 30 de setiembre de 2020.
- Resolución N° 13 del 02 de diciembre de 2019, "Por la cual se autoriza la modificación y ampliación del proyecto "Diseño de la estrategia de transformación educativa del Paraguay 2030", al 31 de marzo de 2021.
- Resolución N° 02 del 10 de febrero de 2021, "Por la cual se autoriza la extensión del plazo del proyecto "Diseño de la estrategia de transformación educativa del Paraguay 2030", al 31 de marzo de 2022.

## FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

27/1/2021

Ministerio de Educación y Ciencias

  
Lic. Giancarlo Campes  
Coordinador General  
Proyecto PNTE 2030



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 2 - DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL PROYECTO	Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030
NOMBRE DE FANTASÍA	PNTE 2030
ORGANISMO EJECUTOR	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Instituciones proponentes: MEC, Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y Ministerio de Hacienda (MH)
AGENCIA FIDUCIARIA	AFD
TÉRMINOS Y CONDICIONES	
Plazo de ejecución vigente (Resolución N° 13/2019)	40 meses
Plazo de ejecución aprobado en Sesión CAFEEI del 10/12/2020	52 meses
Fecha de aprobación por el CAFEEI	23 de noviembre de 2017
Fecha de modificación por el CAFEEI	26 de diciembre de 2018
Fecha de suscripción Convenio AFD - MH	22 de febrero de 2018
Fecha de suscripción Convenio AFD - MEC	28 de mayo de 2019
Fecha de emisión de transferencia de crédito presupuestario	04 de mayo de 2018
Fecha de inicio	24 de noviembre de 2017
Fecha de cierre original	24 de enero de 2019
Fecha de cierre prorrogada	31 de marzo de 2021 (Resolución CAFEEI N° 13/2019)
Fecha de cierre prorrogada	31 de marzo de 2022 (Resolución CAFEEI N° 02/2021)
MONTO Y FUENTE	
Monto inicial (Gs)	12.117.422.214
Monto modificado (Gs)	11.246.610.912
Monto total (Gs)	23.364.033.126
OBJETIVOS	
FIN	El Sistema Educativo Nacional es fortalecido con un Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 y una Hoja de Ruta 2020-2030, reflejando las aspiraciones de la comunidad en general, educadores y representantes del Estado.
PROPÓSITO	Desarrollar el Plan Nacional de Transformación Educativa del Paraguay 2030, con la hoja de ruta 2020-2030, en base a un pacto por la educación para el mejoramiento de la calidad educativa.
COMPONENTES	C1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030 C2. Estrategia comunicacional C3. Gestión eficaz y eficiente
OBSERVACIONES	
Resoluciones de aprobación y modificación: 1) Resolución CAFEEI N° 61 del 23 de noviembre de 2017 " POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL PARAGUAY 2030". 2) Resolución CAFEEI N° 85 del 26 de diciembre de 2018 " POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES REALIZADAS Y SE AUTORIZA LA AMPLIACION DEL PLAZO DEL PROYECTO DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL PARAGUAY 2030". 3) Resolución CAFEEI N° 11 del 13 de setiembre de 2019 " POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXTENSION DEL PLAZO DEL PROYECTO DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL PARAGUAY 2030 - PNTE2030". 4) Resolución CAFEEI N° 13 de fecha 02 de diciembre de 2019 "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA MODIFICACION Y AMPLIACION DEL PROYECTO DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL PARAGUAY 2030". 5) Resolución CAFEEI N° 02 de fecha 10 de febrero de 2021 "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXTENSIÓN DEL PLAZO DEL PROYECTO DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL PARAGUAY 2030"	
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	
27/1/2021	Ministerio de Educación y Ciencias

*Giancarlo Camperi*  
Econ. Giancarlo Camperi  
Coordinador General  
Proyecto PNTE 2030





PARTE 3 - MARCO LÓGICO		
<b>FIN</b>		
El Sistema Educativo Nacional es fortalecido con un Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 y una Hoja de Ruta 2020-2030, reflejando las aspiraciones de la comunidad en general, educadores y representantes del Estado.		
PROPÓSITO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Desarrollar el Plan Nacional de Transformación Educativa del Paraguay 2030, con la hoja de ruta 2020-2030, en base a un pacto por la educación para el mejoramiento de la calidad educativa.	Plan Nacional de Transformación Educativa del Paraguay 2030 aprobado, Documento conteniendo el pacto por la educación aprobado.	Libro blanco publicado. Documento conteniendo el pacto por la educación publicado.
<b>COMPONENTES</b>		
<b>Componente 1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030</b>	6 informes técnicos en relación a los ejes temáticos aprobados. Evento de presentación pública o lanzamiento realizado con al menos 200 participantes. Propuesta de hoja de ruta para la preparación del plan nacional de transformación educativa y su plan de implementación. Plataforma web de consulta ciudadana funcionando. 2 congresos nacionales realizados. 17 foros departamentales desarrollados. 1 conversatorio ejecutado. paneles desarrollados. 1 seminario realizado. 6 notas técnicas para apoyar el desarrollo de los ejes temáticos. PNTE 2030 y hoja de ruta 2020-2030 aprobado.	Acta del Comité Estratégico aprobando los 6 informes técnicos en relación a los ejes temáticos. Informe donde se socializa los resultados del evento de lanzamiento. Acta del Comité Estratégico aprobando documento de hoja de ruta. Informe con la entrega de los códigos fuente de la plataforma web. Acta con la sistematización de las conclusiones y recomendaciones formuladas en los 2 congresos nacionales realizados. Acta con la sistematización de las conclusiones y recomendaciones formuladas en los 17 foros departamentales. Acta con la sistematización de las conclusiones y recomendaciones formuladas en el conversatorio. Acta con la sistematización de las conclusiones y recomendaciones formuladas en los 4 paneles. Acta con la sistematización de las conclusiones y recomendaciones formuladas en el seminario. Acta del Comité Estratégico aprobando las notas técnicas vinculadas a los ejes temáticos. Acta del Comité Estratégico aprobando el PNTE 2030 y la Hoja de Ruta 2020-2030.
<b>Componente 2. Estrategia comunicacional</b>	Plan nacional comunicacional aprobado. Estrategia comunicacional aprobada. Materiales de visibilidad aprobados.	Acta del Comité Estratégico aprobando el plan nacional comunicacional. Acta del Comité Estratégico aprobando la estrategia comunicacional. Acta del Comité Estratégico aprobando los materiales de visibilidad.
<b>Componente 3. Gestión eficaz y eficiente</b>	80% de las actividades planificadas se completan en tiempo y forma. Evaluación del proyecto realizada. Auditoría anual desarrollada.	Informe de gestión. Informe de evaluación. Informe de auditoría.
<b>FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN</b>		
27/1/2021		Ministerio de Educación y Ciencias

*Gilberto*  
**Econ. Giancarlo Camperi**  
 Coordinador General  
 Proyecto PNTE 2030



**PARTE 4 - LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO**

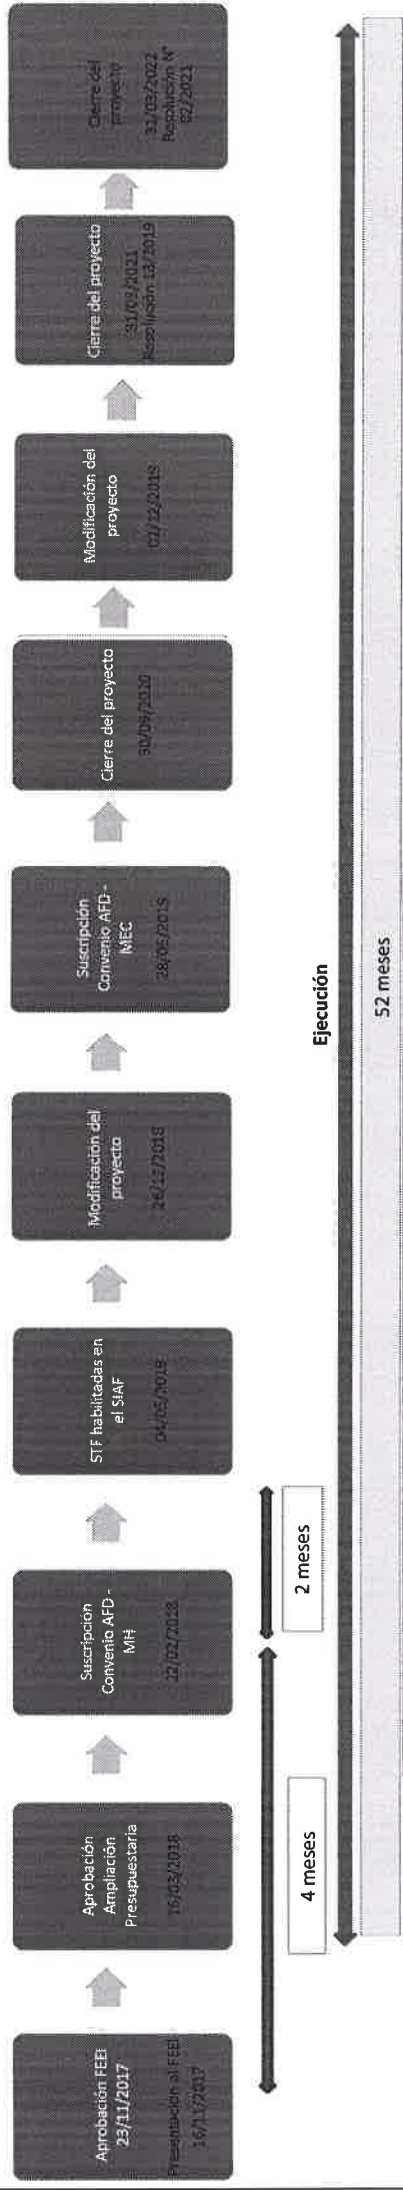

27/1/2021


FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

Ministerio de Educación y Ciencias



*Dr. Giancarlo Campos*  
**Coordinador General**  
 Proyecto PNTE 2030

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

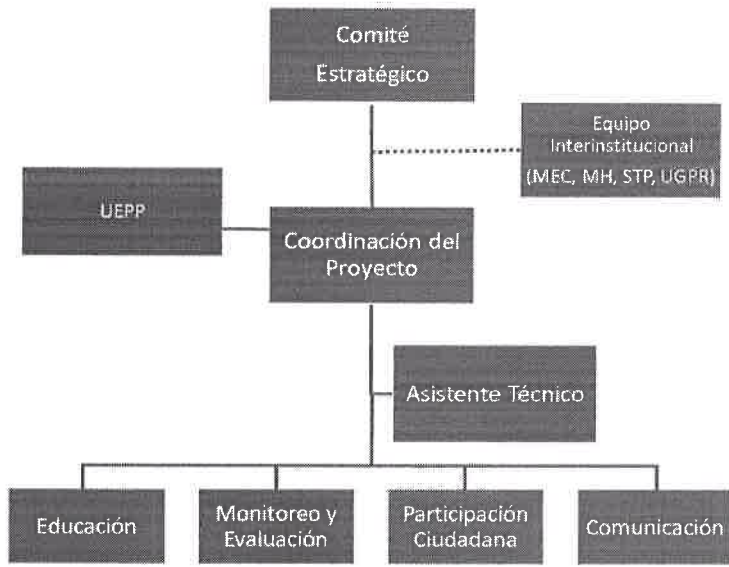


FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	
27/1/2021	Ministerio de Educación y Ciencias

*Giancarlo Campesi*  
**Econ. Giancarlo Campesi**  
Coordinador General  
Proyecto PNTE 2030



## Estructura de Gobernanza

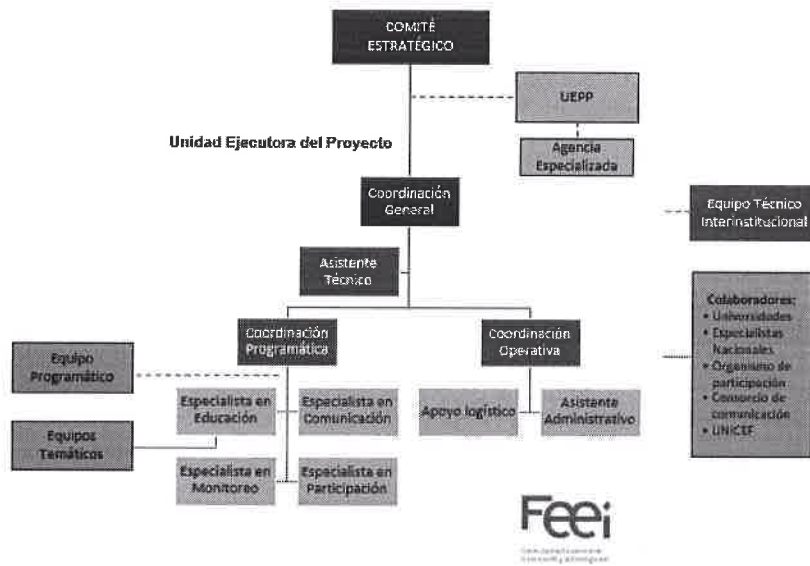

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	
27/1/2021	Ministerio de Educación y Ciencias

  
**Econ. Giancarlo Campana**  
 Coordinador General  
 Proyecto PNTE 2030



Año 2018		Año 2019		Año 2020	
Programa	Presupuesto	Programa	Presupuesto	Programa	Presupuesto
A.1.1	5,062,333.304	5,062,333.304	5,062,333.304	5,062,333.304	5,062,333.304
A.1.1.1	2,340,943.160	2,340,943.160	2,340,943.160	2,340,943.160	2,340,943.160
A.1.1.2	2,388,472.344	2,388,472.344	2,388,472.344	2,388,472.344	2,388,472.344
A.1.1.3	972,973.800	972,973.800	972,973.800	972,973.800	972,973.800
A.1.2	2,099,236.292	2,099,236.292	2,099,236.292	2,099,236.292	2,099,236.292
A.1.2.1	1,196,072.202	1,196,072.202	1,196,072.202	1,196,072.202	1,196,072.202
A.1.2.2	124,572.000	124,572.000	124,572.000	124,572.000	124,572.000
A.1.2.3	728,000.000	728,000.000	728,000.000	728,000.000	728,000.000
A.1.2.4	351,000.000	351,000.000	351,000.000	351,000.000	351,000.000
A.1.2.5	154,972.000	154,972.000	154,972.000	154,972.000	154,972.000
A.1.3	2,027,497,400	2,027,497,400	2,027,497,400	2,027,497,400	2,027,497,400
A.1.3.1	1,006,229,250	1,006,229,250	1,006,229,250	1,006,229,250	1,006,229,250
A.1.3.2	941,644,250	941,644,250	941,644,250	941,644,250	941,644,250
A.1.3.3	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
A.1.3.4	132,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000
A.1.3.5	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
A.1.3.6	481,664,650	481,664,650	481,664,650	481,664,650	481,664,650
A.1.3.7	270,000,000	270,000,000	270,000,000	270,000,000	270,000,000
A.1.3.8	50,107,000	50,107,000	50,107,000	50,107,000	50,107,000
A.1.3.9	8,609,988	8,609,988	8,609,988	8,609,988	8,609,988
A.1.3.10	27,229,225	27,229,225	27,229,225	27,229,225	27,229,225
A.1.3.11	11,497,700,825	11,497,700,825	11,497,700,825	11,497,700,825	11,497,700,825
<b>TOTAL</b>					

Programa	Presupuesto	Programa	Presupuesto
Programa 1	19,400,000.00	Programa 1	19,400,000.00
Programa 2	1,041,720.20	Programa 2	1,041,720.20
Programa 3	422,000.00	Programa 3	422,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,863,720.20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20,863,720.20</b>

Año	Presupuesto	Programa	Presupuesto
2017	11,000,000.00	Programa 1	11,000,000.00
2018	11,000,000.00	Programa 1	11,000,000.00
2019	9,200,000.00	Programa 1	9,200,000.00
2020	13,200,000.00	Programa 1	13,200,000.00

2020  
Ministerio de Educación y Ciencia



*Giancarlo Campieri*  
**Leon Giancarlo Campieri**  
 Coordinador General  
 Proyecto PNTE 2030



PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)

EDT	COMPONENTES / PRODUCTOS	OG	SEGUNDO SEMESTRE DE 2020						TOTAL EJECUTADO ACUMULADO PAGADO A TRAVÉS DE OEI al 31/12/2020	% DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE OEI	
			a	b	c	d	e	f			
			TOTAL APROBADO	MONTO COMPROMETIDO (*) ACUMULADO (desde el inicio al 31/12/2020)	% COMPROMETIDO	MONTO TRANSFERIDO A LA OEI	EJECUCIÓN ACUMULADA (desde el inicio al 31/12/2020)	% DE EJECUCIÓN	SALDO FINANCIERO (31/12/2020)		
<b>TOTAL PROYECTO</b>			<b>21.564.033.126</b>	<b>22.498.995.274</b>	<b>97%</b>	<b>19.648.219.871</b>	<b>22.619.006.774</b>	<b>97%</b>	<b>558.022.348</b>	<b>1.856.847.928</b>	<b>8%</b>
<b>C.1.</b>	<b>Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030</b>										
A.1.1.	Brindar apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030		6.234.741.188	8.234.741.188	100%	5.908.959.308	6.169.713.484	98%	(107.025.502)	631.578.681	10%
A.1.1.1.	Elaborar insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)	260	1.886.333.790	1.886.333.790	100%	-	1.866.333.790	100%	-	-	0%
A.1.1.2.	Convocar al evento de lanzamiento y funcionamiento de la plataforma digital	260		350.448.090	100%		243.422.588	96%	(107.025.502)	-	0%
A.1.1.2.a	Brindar asesoramiento técnico para el proceso de diálogo nacional	852	2.412.442.434	2.061.994.344	100%	2.061.994.344	2.061.994.344				0%
A.1.1.3.	Realizar congresos nacionales, fotos, seminarios, paneles	852	1.595.464.964	1.595.464.964	100%	1.595.464.964	1.595.464.964	100%	-	389.304.138	24%
A.1.1.4.	Contratar a la coordinación del proyecto	852	342.500.000	342.500.000	100%	342.500.000	342.500.000	100%	-	242.274.545	71%
A.1.2.	Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las mesas temáticas y foros regionales		5.282.239.232	5.282.239.232	100%	4.985.303.898	5.329.276.233	101%	-	746.096.334	15%
A.1.2.1.	Contratar expertos nacionales	852	2.160.000.000	2.160.000.000	100%	2.160.000.000	2.160.000.000	100%	-	180.000.000	8%
A.1.2.2.	Contratar expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo y foros	852	533.880.000	533.880.000	100%	533.880.000	533.880.000	100%	-	-	0%
A.1.2.3.	Contratar equipo u organización de apoyo técnico para la articulación de la participación ciudadana	862	1.392.963.000	1.392.963.000	100%	1.193.561.000	1.440.000.000	103%	-	308.365.000	22%
A.1.2.4.	Contratar especialistas temáticos y de apoyo técnico para la coordinación del proyecto	852	840.000.000	840.000.000	100%	742.466.666	840.000.000	100%	-	243.533.334	29%
A.1.2.5.	Contratar asistentes técnicos	852	144.000.000	144.000.000	100%	144.000.000	144.000.000	100%	-	28.200.000	20%
A.1.2.6.	Realizar actividades de apoyo al proceso de participación ciudadana	852	211.396.232	211.396.232	100%	211.396.232	211.396.232	100%	-	6.000.000	3%
A.1.3.	Brindar asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030		7.692.337.422	7.692.337.422	100%	7.692.337.422	7.682.337.422	100%	-	-	0%
A.1.3.1.	Elaborar notas técnicas sobre al menos 6 áreas temáticas	852	3.139.554.698	3.139.554.698	100%	3.139.554.698	3.139.554.698	100%	-	-	0%
A.1.3.3.	Brindar asesoramiento técnico para el proceso de diálogo nacional y la sistematización por ejes temáticos para la construcción del PNTE 2030 y hoja de ruta 2020-2030	852	3.038.991.470	3.038.991.470	100%	3.038.991.470	3.038.991.470	100%	-	-	0%
A.1.3.4.	Elaborar documento final resumen, resumen ejecutivo y socialización del PNTE 2030 y hoja de ruta 2020-2030	852	1.513.791.254	1.513.791.254	100%	1.513.791.254	1.513.791.254	100%	-	-	0%
<b>SUB TOTAL COMPONENTE 1</b>			<b>19.211.817.842</b>	<b>19.211.317.842</b>	<b>100%</b>	<b>16.877.606.828</b>	<b>19.131.329.340</b>	<b>100%</b>	<b>-107.025.502</b>	<b>1.397.577.017</b>	<b>7%</b>
<b>C.2.</b>	<b>Estrategia Comunicacional</b>										
A.2.1.	Desarrollar e implementar estrategia comunicacional		2.912.509.354	2.123.685.146	85%	2.074.918.478	2.123.685.146	85%	388.824.208	153.433.314	8%
A.2.1.1.	Contratar firma para la elaboración del diseño e implementación de la estrategia comunicacional	852	1.530.765.146	1.530.765.146	100%	1.530.765.146	1.530.765.146	100%	-	-	0%
A.2.1.1.a	Contratar servicios de pauta en medios	260	388.824.208		0%			0%	388.824.208		0%
A.2.1.2.	Contratar firma para provisión de materiales para visibilidad	852	382.920.000	382.920.000	100%	382.920.000	382.920.000	100%	-	-	0%
A.2.1.3.	Contratar especialista técnico de apoyo a la comunicación	852	210.000.000	210.000.000	100%	161.233.333	210.000.000	100%	-	153.433.334	73%
<b>SUB TOTAL COMPONENTE 2</b>			<b>2.912.509.354</b>	<b>2.123.685.146</b>	<b>85%</b>	<b>2.074.918.478</b>	<b>2.123.685.146</b>	<b>85%</b>	<b>388.824.208</b>	<b>153.433.314</b>	<b>8%</b>
<b>C.3.</b>	<b>Gestión eficiente</b>										
A.3.1.	Fortalecer el equipo de gestión		1.158.201.656	1.188.201.656	100%	895.700.764	1.188.201.656	100%	-	305.737.577	26%
A.3.1.1.	Contratar a la coordinación general del proyecto	852	237.500.000	237.500.000	100%	-	237.500.000	100%	-	237.500.000	100%
A.3.1.2.	Gestión administrativa	852/260	790.701.656	790.701.656	100%	755.700.764	790.701.656	100%	-	68.237.577	9%
A.3.1.3.	Monitoreo externo y rendición de cuentas	852	140.000.000	140.000.000	100%	140.000.000	140.000.000	100%	-	-	0%
A.3.2.a.	Realizar la evaluación del proyecto	260	152.004.274	139.470.632	40%	-	139.470.632	40%	212.533.642	-	0%
A.3.2.b.	Realizar la auditoría externa del proyecto	260	120.000.000	56.320.000	47%	-	56.320.000	47%	83.680.000	-	0%
<b>SUB TOTAL COMPONENTE 3</b>			<b>1.040.205.930</b>	<b>1.188.992.288</b>	<b>83%</b>	<b>895.700.764</b>	<b>1.367.992.288</b>	<b>81%</b>	<b>226.213.642</b>	<b>305.737.577</b>	<b>59%</b>
<b>TOTAL</b>			<b>21.564.033.126</b>	<b>22.498.995.274</b>	<b>97%</b>	<b>19.648.219.871</b>	<b>22.619.006.774</b>	<b>97%</b>	<b>558.022.348</b>	<b>1.856.847.928</b>	<b>8%</b>

<b>OBSERVACIONES:</b>	
TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO MEC CON OEI	19.648.219.871
TOTAL TRANSFERIDO A LA OEI	19.648.219.871
TOTAL EJECUTADO/PAGADO A TRAVÉS DE OEI AL 31/12/2020 (MH y MEC)	1.856.847.928

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN  
 11/11/2021  
 Ministerio de Educación y Ciencias

Econ. Giancarlo Campero  
 Coordinador General  
 Proyecto PNTE 2030



PARTE 7 - AVANCE FISICO (Productos Programados/Ejecutados)

COMPONENTES	EDT	Productos / actividades	Metas	Unidad	Pl. Programado E. Ejecutado	Avance de los productos							TOTAL	
						1	2	3	4					
						31/12/2017	30/6/2018	31/12/2018	30/6/2019	31/12/2019	30/6/2020	31/12/2020		
C1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030	1.1.1.	Insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias) elaborados	6	Informes elaborados	P	0	0	6	0	0	0	6		
					E	0	0	6	0	0	0	6		
	1.1.2.	Evento de lanzamiento realizados, plataforma digital en funcionamiento y mesas de trabajo conformadas	1	Evento de lanzamiento realizado	P	1	0	0	0	0	0	0	1	
					E	0	1	0	0	0	0	1		
			1	Plataforma digital en funcionamiento	P	1	0	0	0	0	0	1		
					E	0	0	1	0	0	0	1		
			6	Mesas de trabajo conformadas	P	0	6	0	0	0	0	6		
					E	0	0	0	0	0	6	6		
	1.1.3.	Congresos nacionales, foros, seminarios, paneles y otros	2	Congresos nacionales realizados	P	0	1	1	0	0	0	2		
					E	0	0	0	0	0	0	0		
			17	Foros regionales realizados	P	0	0	0	0	17	0	17		
					E	0	0	0	0	0	0	0		
			2	Conversatorio/audiencias	P	0	0	1	0	1	0	2		
					E	0	0	1	0	0	22	23		
			4	Paneles	P	0	0	0	4	0	0	4		
					E	0	0	0	4	0	0	4		
			1	Seminario	P	0	0	0	1	0	0	1		
					E	0	0	0	1	0	0	1		
			1.1.4.	Coordinador del proyecto	1	Contrato	P	0	0	0	1	0	0	1
							E	0	0	0	1	0	0	1
	1.2.1.	Expertos nacionales y/o organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de contenidos de mesas de trabajo	7	Contrato	P	0	0	0	0	7	0	7		
					E	0	0	0	0	6	0	6		
	1.2.2.	Expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo	2	Contrato	P	0	0	0	2	0	0	2		
					E	0	0	0	0	0	2	2		
	1.2.3.	Contratar equipo u organización de apoyo técnico para la articulación de la participación ciudadana	1	Contrato	P	1	0	0	0	0	0	1		
					E	1	0	0	0	0	0	1		
	1.2.4.	Especialistas temáticos y de apoyo técnico a la coordinación del proyecto	4	Contrato	P	3	0	0	0	0	1	4		
					E	0	2	0	0	1	1	4		
	1.2.5.	Asistente técnico de Componente (al menos 2 profesionales)	2	Contrato	P	0	0	0	1	0	1	2		
					E	0	0	0	0	0	1	1		
	1.2.6.	Realizar actividades de apoyo al proceso de participación ciudadana	1	Contrato	P	1	0	0	0	0	1	2		
					E	0	0	0	0	0	0	1		
	1.3.1.	Notas técnicas sobre áreas temáticas	6	Notas Técnicas	P	0	0	0	0	0	6	6		
					E	0	0	0	0	0	6	6		
	1.3.3.	Asesoramiento técnico para el proceso del diálogo	2	Contrato	P	0	0	0	0	0	2	2		
					E	0	0	0	0	0	2	2		
	1.3.4.	Documento final, resumen ejecutivo y socialización del PNTE	1	Documento	P	0	0	0	0	0	1	1		
					E	0	0	0	0	0	0	0		
	C2. Estrategia Comunicacional	2.1.1.	Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	1	Contrato	P	0	0	0	1	0	0	1	
						E	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.a		Contratar servicios de pauta en medios	1	Contrato	P	0	0	0	0	0	1	1		
					E	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2.		Materiales para visibilidad	1	Contrato	P	0	0	0	1	0	0	1		
				E	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3.	Contatar especialista técnico de apoyo a la comunicación	2	Contrato	P	1	0	0	0	0	0	1			
				E	0	1	0	0	0	0	1			
3. Gestión eficaz y eficiente	3.1.1.	Coordinador/a general del proyecto	1	Contrato	P	1	0	0	0	0	0	1		
					E	1	0	0	0	0	0	1		
	3.1.2.	Gestión administrativa	1	Contrato	P	1	0	0	0	0	0	1		
					E	1	0	0	0	0	0	1		
	3.1.3.	Monitoreo externo y rendición de cuentas	1	Contrato	P	0	0	0	0	0	1	1		
					E	0	0	0	0	0	0	0		
	3.2.A.	Evaluación del proyecto	1	Contrato	P	0	0	0	0	0	0	0		
					E	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.B.	Auditoría externa del proyecto realizada	1	Contrato	P	0	0	0	0	1	1	2			
				E	0	0	0	0	0	0	0			

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:  
27/1/2021 Ministerio de Educación y Ciencias

Econ. Giancarlo Campora  
Coordinador General  
Proyecto PNTE 2030



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 8 - AVANCE FINANCIERO

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	
27/3/2021	Ministerio de Educación y Ciencias

PRODUCTOS/ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución en Guaraníes)							
				Año 2017		Año 2018		TOTAL			
				11/12/2017	30/09/2018	31/12/2018					
<b>A.1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023</b>		<b>5.682.393.304</b>									
A.1.1.1 Elaboración de insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)		2.340.945.160									
A.1.1.2 Realización de evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	Consultorías, Asesorías e Investigaciones	2.388.472.344	266								
A.1.1.3 Realización de Congresos Nacionales (Intermedio y de Cierre) y Foros Regionales		952.975.800									
A.1.1.4 Supervisión técnica para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023											
<b>A.1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales</b>		<b>2.608.015.536</b>									
A.1.2.1 Contratación de organizaciones de la sociedad civil y expertos nacionales para el desarrollo de mesas de trabajo		1.196.072.202									
A.1.2.2 Contratación de expertos internacionales para el desarrollo de mesas de trabajo	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	533.880.000	852								
A.1.2.3 Contratación de equipo técnico para el desarrollo de las mesas e implementación del proyecto*		199.402.000									
A.1.2.4 Contratación de coordinadores temáticos		379.069.334									
A.1.2.5 Contratación de asistente técnico		144.000.000									
A.1.2.6 Monitoreo y seguimiento a los foros	Pasajes y viáticos	155.592.000	232								
<b>A.1.3 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023</b>		<b>1.736.126.346</b>									
	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo		852								
<b>TOTAL COMPONENTE 1</b>		<b>10.026.535.186</b>									
<b>A.2.1. Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional</b>		<b>1.128.695.917</b>									
A.2.1.1 Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	911.644.250	852								
A.2.1.2 Materiales de Visibilidad		45.085.000									
A.2.1.3 Coordinador/a Comunicación		171.966.667									
<b>TOTAL COMPONENTE 2</b>		<b>1.128.695.917</b>									
<b>A.3.1. Gestión eficaz y eficiente</b>		<b>605.871.111</b>									
A.3.1.1 Coordinador/a general del proyecto	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	420.000.000	852								
A.3.1.1.1 Coordinador de administración y finanzas (asignaciones complementarias)	Remuneraciones extraordinarias	185.871.111	123								
	Remuneración adicional		125								
	Gratificación por servicios especiales		137								
A.3.1.1.2 Especialista en Adquisiciones. Asignaciones complementarias	Remuneraciones extraordinarias		123								
	Remuneración adicional		125								
	Gratificación por servicios especiales		137								
A.3.1.1.3 Coordinadora Logística. Asignaciones complementarias	Honorarios profesionales		145								
A.3.1.1.4 Asistente Administrativo. Asignaciones complementarias	Remuneraciones extraordinarias		123								
	Remuneración adicional		125								
	Gratificación por servicios especiales		137								
<b>A.3.2. Auditoría Externa del Proyecto</b>		<b>356.320.000</b>									
			266								
<b>TOTAL COMPONENTE 3</b>		<b>962.191.111</b>									
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>		<b>12.117.422.214</b>									

PRODUCTOS/ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución en Guaraníes)						
				Año 2017		Año 2018		TOTAL		
				11/12/2017	30/09/2018	31/12/2018				
<b>A.1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023</b>		<b>5.682.393.304</b>								
A.1.1.1 Elaboración de insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)		2.340.945.160								
A.1.1.2 Realización de evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	Consultorías, Asesorías e Investigaciones	2.388.472.344	266 / 852							
A.1.1.3 Realización de Congresos Nacionales (Intermedio y de Cierre) y Foros Regionales		952.975.800								
<b>A.1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales</b>		<b>2.608.015.536</b>								
A.1.2.1 Contratación de organizaciones de la sociedad civil y expertos nacionales para el desarrollo de mesas de trabajo	Consultorías, asesorías e	1.196.072.202	260/852							

Econ. Giancarlo Campos  
 Coordinador General  
 Proyecto PNTE 2030

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 8 - AVANCE FINANCIERO

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	
27/1/2021	Ministerio de Educación y Ciencias

Actividad	Descripción	Costo Total	OG / PGN	P	E	Avance	Avance	Total	Avance
A.1.2.2	Contratación de expertos internacionales para el desarrollo de mesas de trabajo.	533.880.000		P		533.880.000		533.880.000	0%
A.1.2.3	Contratación de equipo técnico para el desarrollo de las mesas e implementación del proyecto*	199.402.000	260/852	P		47.037.000		47.037.000	0%
A.1.2.4	Contratación de coordinadores temáticos	379.069.334		P		299.136.000		299.136.000	100%
A.1.2.5	Contratación de asistente técnico	144.000.000		P		144.000.000		144.000.000	0%
A.1.2.6	Monitoreo y seguimiento a los foros	155.592.000	232/852	P		155.592.000		155.592.000	0%
A.1.3	Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	1.736.126.346	260/852	P		703.005.236		2.439.131.542	0%
<b>TOTAL COMPONENTE 1</b>				P		9.013.923.776		703.005.236	9.013.923.776
<b>A.2.1. Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional</b>				P		1.088.729.250		1.088.729.250	86,9%
<b>A.2.1.1 Diseño e Implementación de la estrategia comunicacional</b>				P		911.644.250		911.644.250	0%
<b>A.2.1.2 Materiales de Visibilidad</b>				P		45.085.000		45.085.000	0%
<b>A.2.1.3 Coordinador/a Comunicación</b>				P		132.000.000		132.000.000	100%
<b>TOTAL COMPONENTE 2</b>				P		1.128.695.917		1.128.695.917	96%
<b>A.3.1. Gestión eficaz y eficiente</b>				P		396.621.219		219.947.332	55%
<b>A.3.1.1. Coordinador/a General del Proyecto</b>				P		240.000.000		240.000.000	100%
<b>A.3.1.2. Gestión Administrativa</b>				P		156.621.219		376.568.551	100%
<b>A.3.2.A. Evaluación del Proyecto</b>				P		300.000.000		300.000.000	48%
<b>A.3.2.B. Auditoría Externa del Proyecto</b>				P		56.320.000		56.320.000	1%
<b>TOTAL COMPONENTE 3</b>				P		752.941.219		219.947.332	752.941.219
<b>TOTAL COMPONENTE 4</b>				P		10.855.594.245		10.855.594.245	108%
<b>TOTAL COMPONENTE 5</b>				P		89.651.000		9.641.256.321	94%

PRODUCTOS/ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución en Guayanes)					
				2020	2021	TOTAL	AVANCE		
A.1.1	Brindar apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de ruta 2020-	6.236.741.188			3.039.271.044	6.236.741.188	0%		
A.1.1.1	Elaborar Insumos técnicos (estado de arte y nuevas evidencias)	1.866.333.790	260		2.912.245.542	1.866.333.790	99%		
A.1.1.2	Convocar al evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	2.412.442.434	260		350.488.090	243.422.588	69%		
A.1.1.2.a	Brindar asesoramiento técnico para el proceso de diálogo nacional	1.595.464.964	852		642.489.164	642.489.164	40%		
A.1.1.4	Contratar la coordinación del proyecto	342.500.000	852		160.000.000	160.000.000	47%		
A.1.2	Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las mesas temáticas y foros regionales	5.282.239.232	852		2.674.223.696	2.674.223.696	51%		
A.1.2.1	Contratar expertos nacionales	2.160.000.000	852		963.927.798	963.927.798	45%		
A.1.2.2	Contratación de expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesa de trabajo	533.880.000	852				0%		
A.1.2.3	Contratar equipo u organización de apoyo técnico a la coordinación del proyecto	1.392.963.000	852		1.193.561.000	1.193.561.000	86%		
A.1.2.4	Contratar especialistas temáticos y de apoyo técnico a la coordinación del proyecto	840.000.000	852		460.930.666	460.930.666	55%		
A.1.2.5	Contratación de asistentes técnicos	144.000.000	852				0%		
A.1.2.6	Realizar actividades de apoyo al proceso de participación ciudadana	211.396.232	852		55.804.232	55.804.232	26%		
A.1.3	Asistencia especializada para la profundización de estudios	7.692.337.422	852		5.253.205.880	5.253.205.880	68%		
A.1.3.1	Elaborar notas técnicas sobre al menos 6 áreas temáticas	3.139.554.698	852		700.423.156	700.423.156	22%		
A.1.3.2	Brindar asesoramiento técnico para el proceso de diálogo nacional y la sistematización por ejes temáticos	3.038.991.470	852		3.038.991.470	3.038.991.470	100%		
A.1.3.3	Elaborar documento final resumen, resumen ejecutivo y socialización del PNTE 2030	1.513.791.254	852		1.513.791.254	1.513.791.254	100%		
<b>TOTAL COMPONENTE 1</b>				P		10.839.675.118		10.839.675.118	56%
<b>A.2.1. Desarrollar e implementar estrategia comunicacional</b>				P		1.383.813.437		994.989.229	40%
<b>A.2.1.1. Diseño e implementación de la estrategia comunicacional</b>				P		619.120.896		619.120.896	40%
<b>A.2.2.a. Contratar servicios de pauta en medios</b>				P		388.824.208		388.824.208	0%
<b>A.2.1.2. Materiales de visibilidad</b>				P		337.835.000		337.835.000	88%
<b>A.2.3. Especialista técnico de apoyo a la comunicación</b>				P		38.033.333		38.033.333	18%
<b>TOTAL COMPONENTE 2</b>				P		1.383.813.437		994.989.229	40%

Econ. Giancarlo Compe...  
 Coordinador General  
 Proyecto PNTE 2030



PARTE 8 - AVANCE FINANCIERO

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	
27/1/2021	Ministerio de Educación y Ciencias

Código	Descripción	Transferencias corrientes a Entidades del	Cuentas	Presupuesto		Ejecución		%
				P	E	P	E	
A.3.1.	Gestión eficaz y eficiente	1.168.201.656		524.883.213	-	524.883.213	100%	45%
A.3.1.1.	Coordinador/a general del proyecto	237.500.000	852	-	-	237.500.000	-	-
A.3.1.2.	Gestión administrativa	790.701.656		384.883.213	-	384.883.213	100%	49%
A.3.1.3.	Monitoreo externo y rendición de cuentas	140.000.000	852	140.000.000	-	140.000.000	100%	100%
A.3.2.A.	Evaluación del proyecto	952.004.274	260	212.533.642	-	212.533.642	-	0%
A.3.2.B.	Auditoría externa del proyecto	120.000.000	260	63.480.000	-	63.480.000	0%	0%
<b>TOTAL COMPONENTE 3</b>				<b>801.099.855</b>	<b>-</b>	<b>801.099.855</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>				<b>13.151.616.912</b>	<b>-</b>	<b>12.359.547.560</b>	<b>94%</b>	<b>53%</b>

  
**Econ. Giancarlo Campos**  
**Coordinador General**  
**Proyecto PNTE 2030**



PARTE B - SEGUIMIENTO AL PROCESO

Table with columns: Compromiso, Actividad, Resultado, Descripción de la actividad programada, Actividad realizada, Seguimiento/ Descripción, Acciones a ser implementadas, Responsable, Observaciones. Rows include A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.4, A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4, A.3.1, A.3.2, A.3.3, A.3.4.

Official stamp of the Ministry of Education and Scientific Research, Chile, with signature of Econ. Giancarlo Campa, Coordinator General, Proyecto PVIIE 2020.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 27/11/2021. Ministerio de Educación y Ciencia.

PARTE 10 - LECCIONES APRENDIDAS	
<b>Gestión de recursos humanos y metodología de trabajo:</b>	
<p>Iniciar los conversatorios para la construcción de la visión compartida a nivel interno del MEC fue un acierto, porque permitió probar las herramientas tecnológicas disponibles y al mismo tiempo iniciar la sensibilización a los niveles directivos del ministerio. Las debilidades detectadas en las primeras sesiones fueron subsanadas para los siguientes conversatorios. Se incluye la evaluación y las medidas correctivas tomadas en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HGfeMefP8CI-dJnW-GILJ5YvW7z3LMWw">https://drive.google.com/drive/folders/1HGfeMefP8CI-dJnW-GILJ5YvW7z3LMWw</a></p>	
<p>Realizar las actividades de participación ciudadana en modo virtual implica grandes desafíos a nivel técnico y logístico, pero también supone un menor costo y una mayor llegada a diferentes puntos del país. Entre las dificultades de la modalidad virtual se pueden señalar las siguientes: no todas las personas intervienen como lo harían de forma presencial, son más cansadoras de lo que se siente presencialmente, la interacción y participación efectiva, en general, es más limitada, y resulta más complicado mantener la atención de los participantes en las actividades que se desarrollan.</p>	
<p>La metodología de la Indagación Apreciativa resultó muy adecuada para la etapa de construcción de visión compartida porque permite concentrarse en las oportunidades y en los aspectos positivos.</p>	
<p>Tener claros los productos, responsables y plazos y que esto sea fácil de comunicar y entender por todas las partes involucradas es uno de los grandes desafíos. Que cada parte asume su rol y se comprometa con actitud proactiva es clave para el éxito del proyecto, así como la firmeza y el liderazgo del equipo conductor del proceso. Adicionalmente, contar con la matriz de planificación general con las etapas y con el planeamiento operativo de cada actividad de participación con las tareas (antes, durante y después) con responsables y plazos es fundamental para asegurar el éxito de lo planificado. Se adjunta el link al Cuadro de roles, actividades y productos: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1YIgTBqO6dBS7U8c40P9n2eeqyGQjuofo">https://drive.google.com/drive/folders/1YIgTBqO6dBS7U8c40P9n2eeqyGQjuofo</a></p>	
<p>La revisión de los productos del proyecto presentados por los diferentes equipos (planes de trabajo, preguntas para encuesta digital, guías metodológicas, notas técnicas) implican mucho tiempo de revisión, por lo que se decidió aplicar un protocolo de aprobación de documentos. Link al protocolo de aprobación de documentos: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HhDxTPqIQSj98Nb7xJ8AiqMLykaUkUm">https://drive.google.com/drive/folders/1HhDxTPqIQSj98Nb7xJ8AiqMLykaUkUm</a></p>	
<p>La instalación de las reuniones semanales del equipo programático con la participación de representantes de las diferentes instancias del proyecto ha sido clave para avanzar y tomar decisiones operativas que aceleran la marcha del cronograma de actividades.</p>	
<p>Mantener el equilibrio entre lo urgente y lo importante, así como distinguir lo prioritario para evitar la dispersión de esfuerzos son habilidades que están siendo desarrolladas de manera permanente por los miembros del equipo de la UEP.</p>	
<b>Gestión de recursos financieros/presupuestarios:</b>	
<p>Las dificultades administrativas y operativas como presentación de informes en los plazos previstos, pago al Banco Mundial, transferencia de recursos a OEI con todos los trámites previos están siendo superadas con la incorporación de nuevos miembros al equipo del proyecto en el último semestre del año. Un desafío pendiente, y que requiere mucho seguimiento, es lograr el llamado a auditoría externa que depende de la disponibilidad de tiempo de la UEPP para responder a requerimientos de la DNCP.</p>	
<b>Gestión de comunicación:</b>	
<p>Paliar el rezago en la construcción del diseño de la estrategia de comunicación del proyecto es otro gran desafío que afronta el proyecto. El retraso en la contratación de la empresa de comunicación afectó el proceso. El compromiso y proactividad del equipo de comunicación contratado se perciben como una fortaleza para hacer frente al desafío. Para mitigar los retrasos, el equipo de comunicación, con el acompañamiento de la UEP, está desarrollando un plan de comunicación que permita dar mayor visibilidad al proyecto incluyendo entrenamiento a voceros, gestión de redes sociales, pautajes en medios, desarrollo de materiales de visibilidad, entrevistas con periodistas destacados, etc.</p>	
<b>Gestión de adquisiciones:</b>	
<p>El proyecto no contempla adquisiciones.</p>	
<b>FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN</b>	
27/1/2021	Ministerio de Educación y Ciencias

  
**Econ. Giancarlo Campes**  
 Coordinador General  
 Proyecto PNTE 2030



PARTE 11 - PRODUCTOS ENTREGADOS					
N°	PRODUCTO	RESPONSABLE	STATUS	FECHA DE APROBACIÓN	EVIDENCIAS EN EL DRIVE
1	Informes técnicos (insumos para ejes temáticos)	BIRF	Aprobado	23/5/2019	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/13icyK9-TnbVCSSE7IhwFioIbaVhuATn3">https://drive.google.com/drive/folders/13icyK9-TnbVCSSE7IhwFioIbaVhuATn3</a>
2	Propuesta de hoja de ruta para construcción del PNTE	BIRF	Aprobado	23/5/2019	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/17dPfaxxClmGQ5pVyk-m_cy4IVi4PK9Z">https://drive.google.com/drive/folders/17dPfaxxClmGQ5pVyk-m_cy4IVi4PK9Z</a>
3	Plataforma de consulta digital	BIRF	Aprobado	23/5/2019	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FVZEpz-GbghIBOtVgSxaMUUAOFJDxh4">https://drive.google.com/drive/folders/1FVZEpz-GbghIBOtVgSxaMUUAOFJDxh4</a>
4	Informe de evento de lanzamiento del proyecto	BIRF	Aprobado	23/5/2019	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/134_VbOa79GQzIB20X42HIVFMRbWYxOr8">https://drive.google.com/drive/folders/134_VbOa79GQzIB20X42HIVFMRbWYxOr8</a>
5	Plan de trabajo de Universidad Católica de Chile	Universidad Católica de Chile	Aprobado	3/12/2020	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/12aHHT_Xim0AIWpncZ_ipkGs8Hs0MFoHz">https://drive.google.com/drive/folders/12aHHT_Xim0AIWpncZ_ipkGs8Hs0MFoHz</a>
6	Plan de trabajo de Universidad Columbia de EEUU	Universidad Columbia de EEUU	Aprobado	3/12/2020	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gskO9JXbdh7weXWOaL2f0KRYWpbNuDHx">https://drive.google.com/drive/folders/1gskO9JXbdh7weXWOaL2f0KRYWpbNuDHx</a>
7	Plan de trabajo de organismo encargado de articular la participación ciudadana	CEAMSO	Aprobado	3/12/2020	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Z4HwfxqU91hX9elpLvkCeelPmK_CgnjCB">https://drive.google.com/drive/folders/1Z4HwfxqU91hX9elpLvkCeelPmK_CgnjCB</a>
8	Planes de trabajo de especialistas nacionales	Especialistas nacionales	Aprobado	3/12/2020	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ohEDCpWczVpAz2ECsuwORXaaQ51UmD-J">https://drive.google.com/drive/folders/1ohEDCpWczVpAz2ECsuwORXaaQ51UmD-J</a>
9	Guía metodológica	CEAMSO	En revisión		Documento en revisión. Requiere ajustes. Disponible en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1JtLdlrZzGxca0viMB6Yv0S9R1BQX5kwn">https://drive.google.com/drive/folders/1JtLdlrZzGxca0viMB6Yv0S9R1BQX5kwn</a>
10	Mapa de actores	CEAMSO	En revisión		Documento en revisión, en borrador. Requiere varios ajustes. Disponible en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1JtLdlrZzGxca0viMB6Yv0S9R1BQX5kwn">https://drive.google.com/drive/folders/1JtLdlrZzGxca0viMB6Yv0S9R1BQX5kwn</a>
11	Plan de trabajo empresa de comunicación	Consortio Debroca & Laika	En revisión		Documento en revisión. Disponible en: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1adpRZUuHz372mKhpKQuaDLD7">https://drive.google.com/drive/folders/1adpRZUuHz372mKhpKQuaDLD7</a>

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	
27/1/2021	Ministerio de Educación y Ciencias

  
**Econ. Giancarlo Campesi**  
 Coordinador General  
 Proyecto PNTE 2030

