



**INFORME DE MONITOREO**  
**Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del**  
**Paraguay 2030 (PNTE 2030)**

**INFORME SEMESTRAL**

**PERIODO INFORMADO: (Noviembre/Diciembre 2017)**

*Programa conjunto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), y el Ministerio de Hacienda (MH)*

Fecha de Presentación : (Febrero/2018)

  
Ricardo S. Salinas Aguirre  
Director  
DSIP - SSEE

000002



Facundo S. Salinas Aguirre  
Director  
DSP - SSEE

Ministerio de Hacienda	31/01/2018
------------------------	------------

**FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACION**

La calidad educativa, orientada en las exigencias del mundo actual, que enfatiza la formación de ciudadanos críticos, creativos, innovadores, con las competencias necesarias para resolver los problemas globales, es un proceso de construcción social que requiere el compromiso de toda la sociedad. Paraguay, en la mayoría de los casos ha desarrollado programas educativos que apuntan a la universalización de la educación formal pero aún requiere de una mejora sustancial en la equidad del servicio educativo. Tomando como base de apoyo las experiencias exitosas en las últimas reformas nacionales, regionales, e internacionales, se espera construir el PNT 2030, con una nueva visión integradora, basada en acciones concretas que lleven a una transformación educativa integral con énfasis en la calidad. La preparación de un PNT 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023 legitimados por la ciudadanía requerirán el diseño y la implementación de un proceso de consulta nacional amplio para alcanzar consensos sobre las prioridades educativas y desarrollar posibles estrategias para abordar las distintas problemáticas del sistema.

**PARTE 1 - ANTECEDENTES**

**PARTE 2 - DATOS BASICOS DEL PROYECTO**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030
<b>NOMBRE DE FANTASIA</b>	PNTE 2030
<b>ORGANISMO EJECUTOR</b>	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y el Ministerio de Hacienda (MH)
<b>AGENCIA FIDUCIARIA</b>	La unidad ejecutora del proyecto se encuentra a cargo del Ministerio de Hacienda AFD

<b>TERMINOS Y CONDICIONES</b>	
Plazo de Ejecución	14 Meses
Fecha de Aprobación por el FEEL	23 de noviembre del 2017
Fecha de Suscripción Convenio AFD	En trámite
Fecha de emisión de Transferencia de Crédito Presupuestario	En trámite
Fecha de Inicio	24/11/2017
Fecha de Cierre	24/01/2019
Fecha de Cierre prorrogada	
<b>MONTO Y FUENTE</b>	
Monto Inicial (Gs)	G. 12.117.422.214
Monto modificado (Gs)	-
Monto Total (Gs)	G. 12.117.422.214

<b>OBJETIVOS</b>	
<b>FIN</b>	El Sistema Educativo Nacional es fortalecido con un Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 y una Hoja de Ruta 2018 - 2023, reflejando las aspiraciones de la comunidad en general, educadores y representantes del Estado
<b>PROPOSITO</b>	Desarrollar el Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 de Paraguay, con la Hoja de Ruta 2018-2023, en base a un Pacto Nacional para el mejoramiento de la calidad educativa.
<b>COMPONENTES</b>	C1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023 C2. Estrategia Comunicacional C3. Gestión eficaz y eficiente

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACION</b>	31/01/2018
	Ministerio de Hacienda





**Racundo S. Salinas Aguirre**  
 Director  
 DSP - SSEE



Facundo S. Salinas Aguirre  
 Director  
 DSP - SSEE

PART 3 - MARCO LOGICO		FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACION	31/01/2018	Ministerio de Hacienda
COMPONENTES	ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	
Componente C1: Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2030	A1.1 Apoyo técnico para la definición del PNT 2030 y Hoja de Ruta 2018-2030	- Sistematización de 100% de las discusiones educativas de los municipios que han surgido en los encuentros de las mesas y los foros regionales	- 12 informes técnicos elaborados como parte del diagnóstico temáticos	
	A1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	- Congreso Nacional de lanzamiento completado con al menos 200 participantes capacidad de gestión al interior del sistema educativo en Paraguay - Nota técnica presentando una medición sobre la capacidad de gestión entre los directores en las escuelas paraguayas - Foros Regionales completados con al menos 100 participantes	- Nota técnica sobre la gobernanza y capacidad de gestión al interior del sistema educativo en Paraguay - Congreso Nacional intermedio completado con al menos 200 participantes sobre la capacidad de gestión entre los directores en las escuelas paraguayas - Nota técnica presentando recomendaciones para informar los focos de inversión del FEI en base a la evidencia internacional sobre lo que es más efectivo para mejorar los aprendizajes	- Congreso Nacional de cierre completado con al menos 200 participantes de una Ley de Financiamiento Educativo - Nota técnica con propuestas para la mejora del Estatuto Docente y la Reglamentación de la Carta Orgánica del MEC - 6 reportes finales de las mesas de trabajo
Componente C2: Estrategia comunicacional	A2.1 Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional.	- 100% de los spots publicitarios realizados comunicacional elaborado y distribuido - 80% de las entrevistas, videos y material de las entrevistas, videos y material comunicacional elaborado y distribuido	- 2 spots publicitarios culminados - 3 videos de la campaña elaborados - 56 entrevistas en medios masivos - Plataforma de consulta digital lanzada con respuestas de la ciudadanía en todos los departamentos del país	
	A.3.1 Fortalecer el equipo de gestión	- 80% de las actividades planificadas se completan en tiempo y forma	Ejecutora rindiendo cuenta de las tareas acordadas en el plan de trabajo - Comprobantes de pago de prestación de servicios completados y aprobados	A.3.2 Auditoria del Proyecto
Componente C3: Gestión eficaz y eficiente				

000005

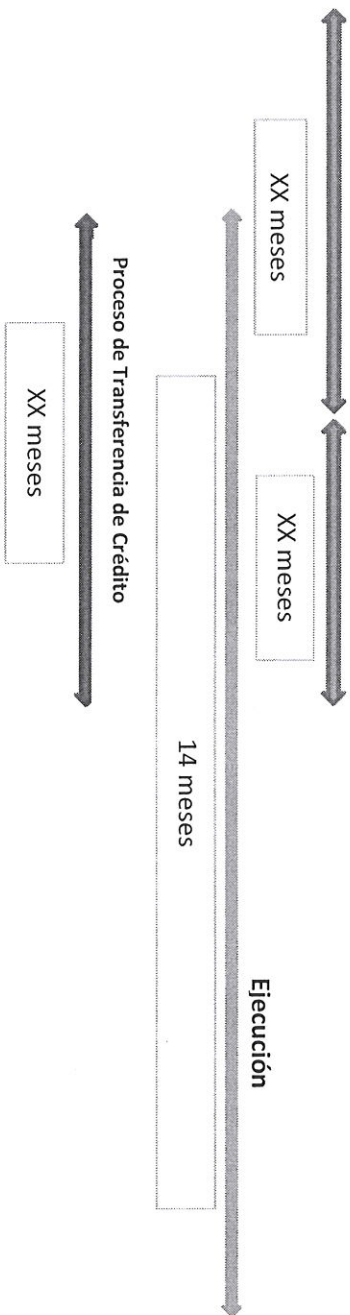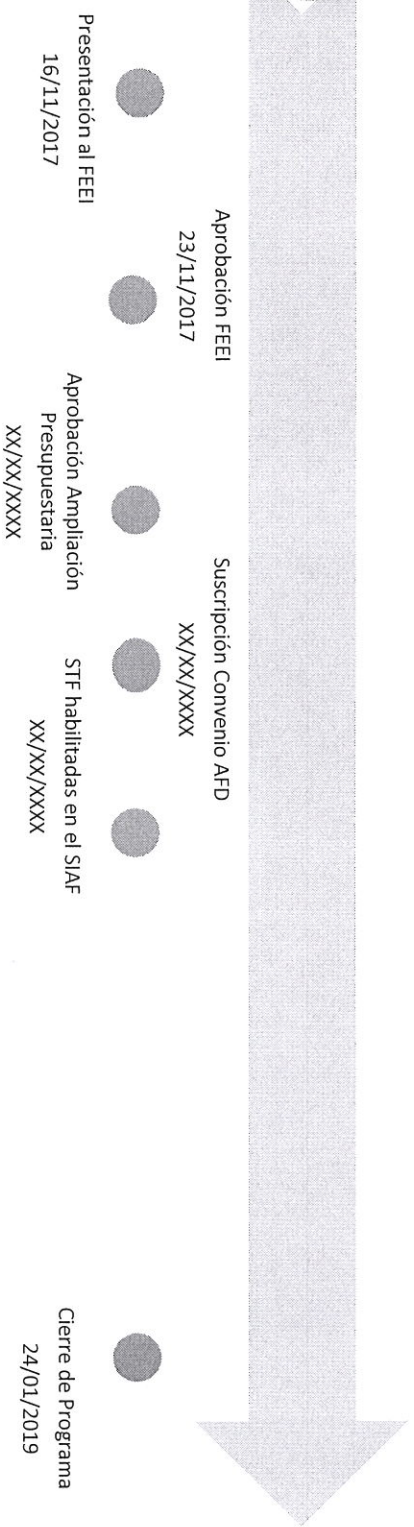


FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
31/01/2018	Ministerio de Hacienda

**Facundo S. Salinas Aguirre**  
Director  
DSJP - SSEE

PARTE 5 - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

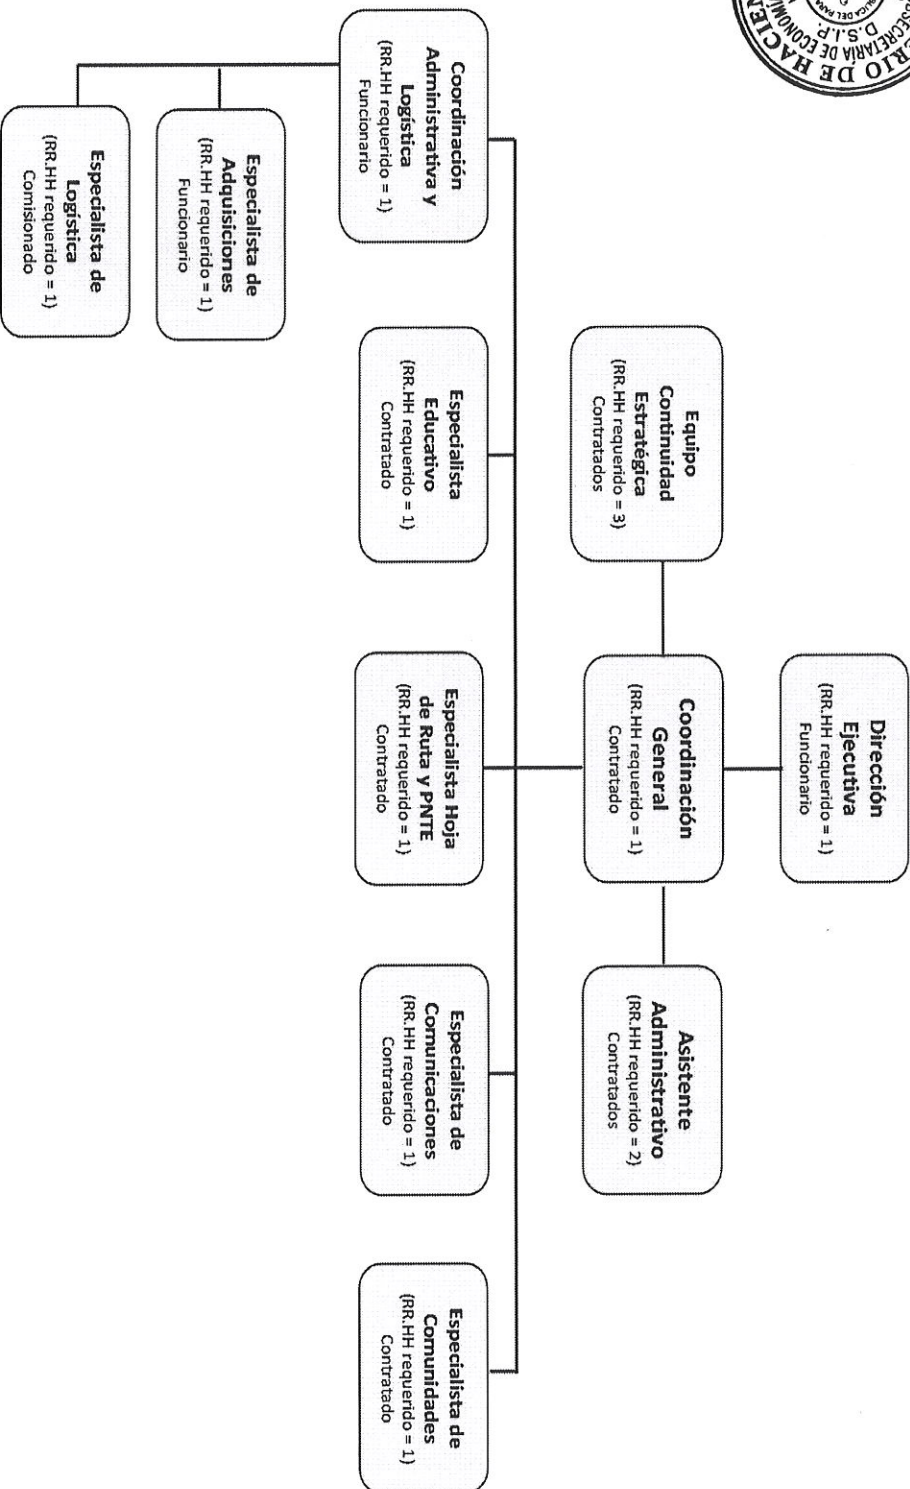

\*Observación: RR.HH (Recursos Humanos)

FECHA DE ÚLTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
31/01/2018	Ministerio de Hacienda

*Fecundo S. Salinas Aguirre*  
Director  
DSIP - SSEE





FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

CUADRO DE COSTOS ANUALIZADO - Convenio de Proyecto (Garantías)

FECHA DE ÚLTIMA DE ACTUALIZACIÓN  
31/01/2018  
Ministerio de Hacienda

	COMPLEMENTOS / ACTIVIDADES	Año 2018			Año 2019			TOTAL		
		Programado	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	PEP Aprob.	Ejecutado
C.1	Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2030	10.409.038.806	-	-	45.000.000	-	-	10.454.038.806	-	-
A.1.1	Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2030	5.682.393.304	-	-	-	-	-	5.682.393.304	-	-
A.1.1.1	Insunso técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)	1.755.112.704	-	-	-	-	-	1.755.112.704	-	-
A.1.1.2	Evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	2.388.472.344	-	-	-	-	-	2.388.472.344	-	-
A.1.1.3	Congresos Nacionales (intermedio y de cierre) y Foros Regionales	952.975.800	-	-	-	-	-	952.975.800	-	-
A.1.1.4	Supervisión técnica para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2030	585.832.456	-	-	-	-	-	585.832.456	-	-
A.1.2	Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	2.699.236.202	-	-	45.000.000	-	-	2.744.236.202	-	-
A.1.2.1	Expertos nacionales y/o organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de contenidos de mesas de trabajo	1.196.072.202	-	-	-	-	-	1.196.072.202	-	-
A.1.2.2	Expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo y Foros	124.572.000	-	-	-	-	-	124.572.000	-	-
A.1.2.3	Equipo de asesoramiento técnico para la implementación del proyecto.	728.000.000	-	-	-	-	-	728.000.000	-	-
A.1.2.4	Coordinadores temáticos	363.000.000	-	-	33.000.000	-	-	396.000.000	-	-
A.1.2.5	Asistente técnico de Componente	132.000.000	-	-	12.000.000	-	-	144.000.000	-	-
A.1.2.6	Monitoreo y seguimiento a los foros	155.592.000	-	-	-	-	-	155.592.000	-	-
A.1.3	Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	2.027.489.360	-	-	-	-	-	2.027.489.360	-	-
C.2	Estrategia Comunicacional	1.088.729.250	-	-	-	-	-	1.088.729.250	-	-
A.2.1	Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional	1.088.729.250	-	-	-	-	-	1.088.729.250	-	-
A.2.1.1	Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	941.644.250	-	-	-	-	-	941.644.250	-	-
A.2.1.2	Materiales para visibilidad	15.085.000	-	-	-	-	-	15.085.000	-	-
A.2.1.3	Coordinador Comunicación	132.000.000	-	-	-	-	-	132.000.000	-	-
C.3	Gestión eficaz y eficiente	471.514.716	-	-	103.139.442	-	-	574.654.158	-	-
A.3.1	Fortalecer el equipo de gestión	471.514.716	-	-	50.639.442	-	-	522.154.158	-	-
A.3.1.1	Coordinador general del proyecto	220.000.000	-	-	20.000.000	-	-	240.000.000	-	-
A.3.1.2	Coordinador de Administración y Finanzas (asignaciones complementarias)	96.107.191	-	-	11.608.638	-	-	107.715.829	-	-
A.3.1.3	Especialista en Adquisiciones. Asignaciones complementarias	58.699.983	-	-	6.756.096	-	-	65.456.079	-	-
A.3.1.4	Coordinadora Logística. Asignaciones complementarias	69.448.167	-	-	7.992.833	-	-	77.441.000	-	-
A.3.1.5	Asistente administrativo. Asignaciones complementarias	27.259.375	-	-	4.281.875	-	-	31.541.250	-	-
A.3.2	Auditoría Externa del Proyecto	-	-	-	52.500.000	-	-	52.500.000	-	-
	TOTAL	11.969.282.772	-	-	148.139.442	-	-	12.117.422.214	-	-

Facundo S. Salinas Aguirre

Director

000000







	Selección del equipo de gestión	522.154.158	-	-	-	-	522.154.158
	Coordinador/a general del proyecto	240.000.000	-	-	-	-	240.000.000
A.3.1.2.	Coordinador de Administración y Finanzas (asignaciones complementarias)	107.715.829	-	-	-	-	107.715.829
A.3.1.3.	Especialista en Adquisiciones. Asignaciones complementarias	65.456.079	-	-	-	-	65.456.079
A.3.1.4	Coordinadora Logística. Asignaciones complementarias	77.441.000	-	-	-	-	77.441.000
A.3.1.5.	Asistente administrativo. Asignaciones complementarias	31.541.250	-	-	-	-	31.541.250
A.3.2.	Auditoría Externa del Proyecto	52.500.000	-	-	-	-	52.500.000
	<b>SUB TOTAL COMPONENTE #</b>	<b>574.654.158</b>					

**OBSERVACIONES**

**Racundo S. Salinas Aguirre**  
 Director  
 DSIP - SSEE



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

**PARTE A - AVANCE FISICO (Productos Programados/Ejecutados)**

Fecha de última actualización  
31/01/2018 Ministerio de Hacienda

COMPONENTES	EDT	Productos / actividades	Métros	Unidad	P. Programado		Avance de los Productos					TOTAL
					E. Ejecutado		1	2	3	3	3	
							31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	
C1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2030	1.1.1	Insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias) elaborados	12	Informes elaborados	P	-	-	-	2	10	-	12
					E	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.2	Evento de lanzamiento realizados, plataforma digital en funcionamiento y mesas de trabajo conformadas	1	Evento de lanzamiento realizado	P	-	-	-	1	-	-	1
					E	-	-	-	-	-	-	-
			1	Plataforma digital en funcionamiento	P	-	-	1	-	-	-	1
					E	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.3	Congresos Nacionales (intermedio y de cierre) Y Foros Regionales realizados	6	Mesas de trabajo conformadas	P	-	-	-	-	6	-	6
					E	-	-	-	-	-	-	-
			2	Congresos nacionales realizados	P	-	-	-	1	1	-	2
					E	-	-	-	-	-	-	-
	9	Foros regionales realizados	P	-	-	-	9	-	-	-	9	
			E	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4	Supervisión técnica para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2030	1	Contrato	P	-	-	-	1	-	-	1	
				E	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	Expertos nacionales y/o organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de contenidos de mesas de trabajo	6	Contrato	P	-	-	-	6	-	-	6	
				E	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	Expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo y Foros	3	Contrato	P	-	-	-	3	-	-	3	
				E	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3	Equipo de asesoramiento técnico para la implementación del proyecto (de al menos 3 profesionales)	1	Contrato	P	-	-	-	1	-	-	1	
				E	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4	Coordinadores temáticos	3	Contrato	P	-	-	-	3	-	-	3	
				E	-	-	-	-	-	-	-	

Facundo S. Salinas Aguirre

Director

DSIP - SSEE



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

C2. Estrategia Comunicacional	1.2.5	Asistente técnico de Componente (al menos 2 profesionales)	2	Contrato	P	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
	1.2.6	Monitoreo y seguimiento a los foros	1	Contrato	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					P	-	1	-	-	-	-	1			
	1.3	Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	1	Convenio	P	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
					E	-	-	-	-	-	-	-			
	2.1.1	Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	1	Contrato	P	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
2.1.2	Materiales para visibilidad	1	Contrato	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				P	-	1	-	-	-	-	1				
2.1.3	Coordinador/a Comunicación	1	Contrato	P	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
				E	-	-	-	-	-	-	-				
3.1.1.	Coordinador/a general del proyecto	1	Contrato	P	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
3.1.2.	Coordinador de Administración y Finanzas (asignaciones complementarias)	1	Designación	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				P	-	1	-	-	-	-	1				
3.1.3	Especialista en Adquisiciones, Asignaciones complementarias	1	Designación	P	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
				E	-	-	-	-	-	-	-				
3.1.4.	Coordinadora Logística, Asignaciones complementarias	1	Designación	P	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
				E	-	-	-	-	-	-	-				
3.1.5	Asistente administrativo, asignaciones complementarias	1	Designación	P	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
				E	-	-	-	-	-	-	-				
3.2	Auditoría externa del proyecto realizada	1	Contrato	P	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
				E	-	-	-	-	-	-	-				
C3. Gestión eficaz y eficiente															

**Facundo S. Salinas Aguirre**  
 Director  
 DSIP - SSEE

000012



EXECUCION FINANCIERA (Garantías)

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACION: 31/01/2018  
Ministerio de Hacienda

COMPONENTE	PRODUCTOS/ACTIVIDADES	DESCRIPCION	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución Acumulada en Garantías)													
					2017		2018		2019		TOTAL							
					31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019									
Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta de	A1.1.1 Elaboración de insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)	5.682.393.304	-	P	-	4.729.417.504	952.975.800	-	-	-	5.682.393.304	0%					
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	2.340.945.160	-	-	-	2.340.945.160	0%						
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	2.388.472.344	-	-	-	2.388.472.344	0%						
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	-	952.975.800	-	-	952.975.800	0%						
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	-	-	-	-	-	-	-					
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	-	-	-	-	-	-	-					
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	-	-	-	-	-	-	-					
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					A1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	A1.2.1 Contratación de organizaciones de la sociedad civil y expertos nacionales para el desarrollo de mesas de trabajo.	A1.2.1.1 Contratación de expertos internacionales para el desarrollo de mesas de trabajo.	1.196.072.202	-	P	-	1.196.072.202	-	-	-	1.196.072.202	0%	
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
P	-	124.572.000	-	-						-	124.572.000	0%						
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
P	-	-	728.000.000	-						-	728.000.000	0%						
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
P	-	-	165.000.000	-						-	165.000.000	0%						
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
P	-	-	60.000.000	-						-	60.000.000	0%						
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
P	-	-	24.840.000	-						-	24.840.000	0%						
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
P	-	-	105.912.000	-						-	105.912.000	0%						
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
P	-	-	31.392.000	-						-	31.392.000	0%						
E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%										
A1.2.2 Contratación de expertos internacionales para el desarrollo de mesas de trabajo.	A1.2.2.1 Contratación de expertos internacionales para el desarrollo de mesas de trabajo.	A1.2.2.1.1 Contratación de expertos internacionales para el desarrollo de mesas de trabajo.	124.572.000	-	P	-	124.572.000	-	-	-	124.572.000	0%						
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	-	728.000.000	-	-	728.000.000	0%						
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	-	198.000.000	-	-	198.000.000	0%						
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	-	72.000.000	-	-	72.000.000	0%						
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	-	24.840.000	-	-	24.840.000	0%						
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	-	105.912.000	-	-	105.912.000	0%						
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	-	31.392.000	-	-	31.392.000	0%						
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					A1.2.3 Contratación de equipo técnico para el desarrollo de las mesas e implementación del proyecto.	A1.2.3.1 Contratación de equipo técnico para el desarrollo de las mesas e implementación del proyecto.	A1.2.3.1.1 Contratación de equipo técnico para el desarrollo de las mesas e implementación del proyecto.	728.000.000	-	P	-	728.000.000	-	-	-	728.000.000	0%	
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
P	-	-	198.000.000	-						-	198.000.000	0%						
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
P	-	-	60.000.000	-						-	60.000.000	0%						
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
P	-	-	24.840.000	-						-	24.840.000	0%						
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
P	-	-	105.912.000	-						-	105.912.000	0%						
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
P	-	-	31.392.000	-						-	31.392.000	0%						
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
A1.2.4 Contratación de coordinadores técnicos	A1.2.4.1 Contratación de coordinadores técnicos	A1.2.4.1.1 Contratación de coordinadores técnicos	396.000.000	-						P	-	396.000.000	-	-	-	396.000.000	0%	
										E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%
										P	-	-	72.000.000	-	-	72.000.000	0%	
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	-	24.840.000	-	-	24.840.000	0%						
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	-	105.912.000	-	-	105.912.000	0%						
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	-	31.392.000	-	-	31.392.000	0%						
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					A1.2.5 Contratación de asistente técnico	A1.2.5.1 Contratación de asistente técnico	A1.2.5.1.1 Contratación de asistente técnico	144.000.000	-	P	-	144.000.000	-	-	-	144.000.000	0%	
										E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%
										P	-	-	24.840.000	-	-	24.840.000	0%	
										E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%
										P	-	-	105.912.000	-	-	105.912.000	0%	
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
P	-	-	31.392.000	-						-	31.392.000	0%						
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
A1.2.6 Monitoreo y seguimiento a los foros	A1.2.6.1 Monitoreo y seguimiento a los foros	A1.2.6.1.1 Monitoreo y seguimiento a los foros	74.520.000	-						P	-	74.520.000	-	-	-	74.520.000	0%	
										E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%
										P	-	-	31.392.000	-	-	31.392.000	0%	
										E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%
										P	-	-	105.912.000	-	-	105.912.000	0%	
										E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%
										P	-	-	31.392.000	-	-	31.392.000	0%	
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					A1.3 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A1.3.1 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A1.3.1.1 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	2.027.409.300	852	P	-	2.027.409.300	-	-	-	2.027.409.300	0%	
										E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%
										P	-	9.161.223.006	-	-	-	9.161.223.006	0%	
										E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%
										P	-	-	1.247.815.800	-	-	1.247.815.800	0%	
										E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%
										P	-	-	45.000.000	-	-	45.000.000	0%	
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
P	-	-	77.000.000	-						-	77.000.000	0%						
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
P	-	-	1.088.729.250	-						-	1.088.729.250	0%						
E	0%	-	0%	-						-	0%	-	0%					
TOTAL COMPONENTE 1	TOTAL COMPONENTE 1	TOTAL COMPONENTE 1	10.454.038.806	-						P	-	10.454.038.806	-	-	-	10.454.038.806	0%	
										E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%
										P	-	1.011.729.250	-	-	-	1.011.729.250	0%	
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	-	77.000.000	-	-	77.000.000	0%						
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	-	45.000.000	-	-	45.000.000	0%						
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					P	-	-	1.088.729.250	-	-	1.088.729.250	0%						
					E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%					
					A2.1. Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional	A2.1.1 Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional	A2.1.1.1 Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional	1.088.729.250	-	P	-	1.088.729.250	-	-	-	1.088.729.250	0%	
										E	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%

Facundo S. Salinas Aguirre  
Director  
DSIP - SSEE

000013



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

COMPONENTE	PRODUCTOS/ACTIVIDADES	DESCRIPCION	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecucion Acumulada en Guaraníes)						TOTAL
					2017		2018		2019		
					31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019		
Estrategia Comunicacional	A.2.1.1 Diseño e Implementación de la estrategia comunicacional	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	941.644.250							941.644.250	
			15.085.000						15.085.000		
	A.2.1.2 Materiales de Visibilidad										
	A.2.1.3 Coordinador/a Comunicación										
		132.000.000								132.000.000	
	<b>TOTAL COMPONENTE 2</b>	<b>1.088.729.250</b>								<b>1.088.729.250</b>	
	Gestión eficaz y eficiente	A.3.1. Gestión eficaz y eficiente	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado	522.154.158							522.154.158
		A.3.1.1 Coordinador/a General del Proyecto									
			240.000.000								240.000.000
		A.3.1.2 Coordinador de Administración y Finanzas (asignaciones complementarias)									
			28.085.414								28.085.414
		46.848.000								46.848.000	
		18.439.537								18.439.537	
		16.344.542								16.344.542	
	30.672.000								30.672.000		
	77.441.000								77.441.000		
	13.981.875								13.981.875		
	10.359.375								10.359.375		
	7.200.000								7.200.000		
	52.500.000								52.500.000		
	574.654.158								574.654.158		
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>12.117.422.214</b>									<b>12.117.422.214</b>	

Racundo S. Salinas Aguirre  
 Director  
 DSP - SSEE

0000014

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION



ACTIVIDADES SEGÚN ML	INDICADORES	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Obs.
<p>A1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2030</p>	<p>Informes elaborados</p> <p>evento de lanzamiento realizado</p> <p>plataforma digital en funcionamiento</p> <p>Mesas de trabajo conformadas</p>	<p>Definición del alcance y naturaleza de los servicios técnicos a ser brindados por el Banco Mundial y las actividades a ser realizadas por el gobierno en el marco del RAS (Acuerdo de Servicios Reembolsables); Solicitar a la Abogacía del Tesoro dictamen sobre la modalidad de contratación a ser implementada. Conformación de los equipos de trabajo por parte del gobierno y el Banco Mundial para contribuir técnicamente y sea parte integral del proceso. Mapeo de los actores y potenciales participantes de los eventos de participación ciudadana (Congresos, Foros). Mapeo de actores claves para contribuir a la construcción del diagnóstico (expertos locales e internacionales; organismos locales e internacionales). Planificación de la logística requerida para llevar a cabo los eventos. Elaborar y remitir las invitaciones para participar en las actividades y eventos previstos. Preparación de TDR para producción de notas diagnósticas. Análisis y validación de los informes presentados. Diseño y construcción de la plataforma digital. Registro y procesamiento de las consultas ciudadanas. Análisis de la información procesada. Elaboración de informes. Convocatoria a los actores claves identificados para la participación en las mesas de trabajo. Realización de las reuniones de trabajo (discusiones sistematizadas sobre los ejes temáticos). Presentación de los informes con las conclusiones de cada mesa. Validación de las conclusiones.</p>	<p>Reuniones de trabajo entre representantes del gobierno y del Banco Mundial para definir el alcance y naturaleza de los servicios técnicos a ser brindados por el Banco Mundial a través del Acuerdo de Servicios Reembolsables (RAS) y las actividades a ser realizadas por el gobierno en el marco del RAS. Tramitación de dictamen jurídico N° 1459 en la Abogacía del Tesoro para la determinación de la modalidad de contratación del RAS.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>DSIP/Coordinador general de la UEP</p>	
<p>C.1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023</p>	<p>foros regionales realizados</p> <p>Contrato</p>	<p>La convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil y diversas instituciones para la participación en el Congreso. Presentación por parte de actores claves sobre la experiencia de reformas implementadas en el sector educativo nacional e internacional. Presentación de la versión preliminar PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2023.</p>	<p>En este periodo no estaba prevista la ejecución de estas actividades.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>DSIP/Coordinador general de la UEP</p>	
<p>A1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales</p>	<p>Contrato*</p> <p>Contrato*</p> <p>Contrato*</p> <p>Contrato*</p> <p>Contrato*</p> <p>Contrato*</p>						

**Facundo S. Salinas Aguirre**  
 Director  
 DSIP - SSEE

000001

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION



C.2. Estrategia Comunicacional	A.2.1. Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional	Contrato*	Elaboración del Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Hacienda y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), organismo a través del cual se efectuarán las contrataciones de los bienes y servicios requeridos. Elaborar TDR para contratación de especialista en comunicación y una firma publicitaria. Realizar el llamado a contratación. Suscripción del contrato. Elaboración de los spots publicitarios. Difusión de los spots.	En este periodo no estaba prevista la ejecución de estas actividades.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinador general de la UEP
		Contrato*	Realizar el llamado a contratación. Selección del prestador de servicio. Suscripción del contrato. Elaboración de los videos. Difusión de los videos.	En este periodo no estaba prevista la ejecución de estas actividades.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinador general de la UEP
C.3. Gestión eficaz y eficiente	A.3.1. Fortalecer el equipo de gestión	Contrato*	Coordinar con los medios de comunicación la participación de los referentes del Proyecto en los programas televisivos, radiales y medios escrito de comunicación. Elaborar agenda de participación en los medios masivos de comunicación. Asistencia a las entrevistas.	En este periodo no estaba prevista la ejecución de estas actividades.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinador general de la UEP
		Designación	Elaborar TDR para contratación de la firma Auditora. Realizar el llamado a contratación. Selección de la firma. Suscribir contrato. Acompañar la gestión auditora. Recepción y remisión del informe de auditoría. Pago de la auditoría. Actividades de cierre del proyecto.	Se elaboró y presentó proyecto de resolución y guía de funciones para la conformación y operación de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP).	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinador general de la UEP
		Designación	Elaborar TDR para contratación de la firma Auditora. Realizar el llamado a contratación. Selección de la firma. Suscribir contrato. Acompañar la gestión auditora. Recepción y remisión del informe de auditoría. Pago de la auditoría. Actividades de cierre del proyecto.	En este periodo no estaba prevista la ejecución de estas actividades.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinador general de la UEP

\* Se prevé la suscripción de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con el objetivo de fortalecer el proceso de la inversión pública de manera de lograr una efectiva articulación de los proyectos a los objetivos nacionales.

<b>FECHA DE ÚLTIMA DE ACTUALIZACIÓN</b>	Ministerio de Hacienda
31/01/2018	

**Facundo S. Salinas Aguirre**  
 Director  
 DSIP - SSEE

0000:0
